

Мол

Р


- організація - Моршньова Ю.П.
- ий код ЄДРПОУ -
- діл освіти Покровської міської ради
- оршньова Ю.П.
- від "07" вересня 2017 року
- будівництва та його адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шкільна, 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за з грудень 2018 р.

(тис. грн.)

Назва об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
виконаних будівельних робіт по будівництву	1294,50000	237,59331	155,30069
у тому числі:			
капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шкільна, 2	1294,50000	237,59331	155,30069
у тому числі:			
будівельні роботи	1225,54194	224,62452	146,89216
витрати	68,95806	12,96879	8,40853
Всього виконаних будівельних робіт	1294,50000	237,59331	155,30069

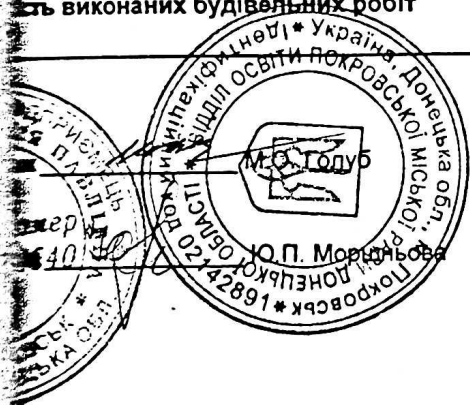

" 22 " 12 2018 року

" 22 " 12 2018 року

Управління Державної казначейської служби України у м. Покровську Донецької області

ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

Дата 22.12.2018

Реєстраційний № зобов'язання 31

КЕКВ / ККК 2132

Відповідальна особа [підпис]

(підпис) № 11

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Розрахунок загально-виробничих витрат до Акту КБ-2в № №


на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Звітний період 1 (грудень 2017 г.)


Виконавець

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд-год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд-год	Виконавець					
				I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тижасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-1-1	Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2	2435,55	120,5	6035,95	68916,75	16489,56	5200,22	0	27725,73
Разом:		2435,55	120,5	6035,95	68916,75	16489,56	5200,22	0	27725,73

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив і ктв. 20.12.17 

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2
(витрати - по факту)

Звітний період 1 (грудень 2017 р.)

Виконавець

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.		
								всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
		I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	2419,06	28,24					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8						
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	16,49	36,58					
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9						
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
5.1		загальнопромислових витрат	люд-год	120,5	50,09					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	2556,05						
		Середній розряд робіт	розряд	2,8						
		II. Будівельні машини і механізми								
6	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,3465	121,17 41,99					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	СН202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	6,6555	34,24 227,89				
8	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	6,16	208 1281,28				
		Разом по розділу II	грн.		1551,16				
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
9	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	7,7616					
10	СН203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	15,8928					
11	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	15,21366					
12	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	19,096					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
13	+С112-26 варіант 1	Бруски 50х50	м3	4,69	11050 51824,50	11050,00 51824,50	- -	- -	
14	+С112-26 варіант 3	Бруски обрізні	м3	0,3363	11050 3716,12	11050,00 3716,12	- -	- -	
15	+С111-542 варіант 1	Вихід на дах	м2	8,4	3610 30324,00	3610,00 30324,00	- -	- -	
16	&С1113-286-1	Вогнезахисний матеріал БС-13(10)	кг	87,5	201 17587,50	201,00 17587,50	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С112-51 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм	м3	10,9095	11050 120549,98	11050,00 120549,98	-	-	
18	+С111-1683-1 варіант 1	Конькова планка	м	140	105,11 14715,40	105,11 14715,40	-	-	
19	&С114-39-У-4 варіант 1	Мінераловатні теплоізоляційні плити	м3	119	1744,45 207589,55	1744,45 207589,55	-	-	
20	+С111-1716 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	4,73	8,64 40,87	8,64 40,87	-	-	
21	&С111-1720-1 варіант 1	Плівка універсальна пароізоляційна	м2	1509,4	15,6 23546,64	15,60 23546,64	-	-	
22	+С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий	т	0,06675	26187,01 1747,98	26187,01 1747,98	-	-	
23	&С130-559-3	Радіатори біметалічні	секція	996	280,73 279607,08	280,73 279607,08	-	-	
24	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,9345	759,35 709,61	759,35 709,61	-	-	
25	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	6,116	35,33 216,08	35,33 216,08	-	-	
26	+С121-32 варіант 1	Снігозатримувач 2м	шт	88	1597,38 140569,44	1597,38 140569,44	-	-	
27	&С111-1678-1-Н	Стрічка монтажна універсальна 2-стороння (скотч)	1000м	0,65625	3233,98 2122,30	3233,98 2122,30	-	-	
28	+С111-1853-7 варіант 1	Цвяхи будівельні	т	0,050984	29040 1480,58	29040,00 1480,58	-	-	
		Разом по розділу IV	грн.		896399,88	896399,88	-	-	

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Перевірив

Іванов Іван Іванович (Іванович)

М. Покровський с/мт. Шевченко, вул. Шкільна

2

Перелік нарахувань:
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1

Розділ . Ремонт покрівлі

1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	11,2	701,04	699,43	-	7851,65	300,48	
	<i>Розрахунок одиничної вартості</i>						E46-40-4			
	<i>Заробітна плата, грн.</i>									
	<i>Витрати труда робітників - будівельників</i>		грн.	26,829	26,07			699,43		
	<i>Середній розряд робіт 2</i>									
	<i>Машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</i>									
	<i>Лобідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]</i>	CH203-405	маш-год	0,693						
	<i>Матеріали</i>									
	<i>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат</i>									
	<i>Електроенергія</i>	C1999-9001	кВт-год	0,77616	1,5894			1,23		
	<i>Мастильні матеріали</i>	C1999-9005	ка	0,00693	54,36			0,38		
	<i>Разом матеріалів, грн.</i>							1,61		
2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	PH8-26-4	100м2	11,2	950,46	817,94	10,55 9,46	10645,15	328,82 3,52	
	<i>Розрахунок одиничної вартості</i>						PH8-26-4			
	<i>Заробітна плата, грн.</i>									
	<i>Витрати труда робітників - будівельників</i>		грн.	29,359	27,86			817,94		
	<i>Середній розряд робіт 2,7</i>									
	<i>Машини та механізми</i>									
	<i>Кран переносний, вантажопідйомність 1 т</i>	CH202-970	маш-год	0,308			34,24 30,70	10,55		
	<i>Разом машин та механізмів</i>							10,55		
	<i>Матеріали</i>									
	<i>Цвяхи будівельні</i>	C111-1853-7 варіант 1	т	0,0042	29040,00			121,97		

Витрати

12	Ледівки електричні, тягове зусилля до 8,70 кН (0,59 т)	СН803-401	маш-год	1,410							
	Пилка дискова електрична	СН270-90	маш-год	1,705							
	Матеріали										
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат										
	Електроенергія	С1999-9001	кВт-год	0,86625	1,5894				1,38		
	Масляні матеріали	С1999-9005	кг	0,01419	54,36				0,77		
	Разом матеріалів, грн.								2,15		
	Улаштування примікань з покрівельних матеріалів	РН8-44-1	100 м	0,89	9562,63	3360,61	67,80	8510,74	98,1	1,8	
							60,79				
	Розрахунок одиничної вартості						РН8-44-1				
	Заробітна плата, грн.										
	Витрати труда робітників - будівельників		грн.	110,22	30,49			3360,61			
	Середній розряд робіт 3,5										
	Машини та механізми										
	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	СН202-970	маш-год	1,98			34,24	67,80			
							30,70				
	Разом машин та механізмів							67,80			
	Машини, враховані в складі загальнопромислових витрат										
	Перфоратори електричні	СН270-135	маш-год	17,094							
	Матеріали										
	Прокат штабовий	С111-1816 варіант 1	т	0,075	26187,01			1964,03			
	Цвяхи будівельні	С111-1853-7 варіант 1	т	0,0016	29040,00			46,46			
	Бруски обрізні	С112-26 варіант 3	м3	0,3	11050,00			3315,00			
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	С1425-11684	м3	1,05	759,35			797,32			
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат										
	Електроенергія	С1999-9001	кВт-год	7,17948	1,5894			11,41			
	Разом матеріалів, грн.							6134,22			
13	Снігозатримувач 2м	С121-32 варіант 1	шт	88	1597,38	-	-	140569,44	-	-	

Витрати, грн.									
I.	Разом прямі витрати		грн.					966264,79	<u>2419,09</u> 16,49
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					896399,92	
	- заробітна плата		грн.					68313,61	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1551,26	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					603,14	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					27725,73	<u>120,50</u> -
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					993990,52	<u>2539,56</u> 16,49
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати								
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					993990,52	<u>2539,56</u> 16,49
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					6926,90	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					3143,94	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					1000917,42	

будівництва - без врахування суми, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
1. Разом		грн.					1004061,38	
- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	Розрахунок N П-137	грн.					52845,33	
Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1056906,69	<u>2539,56</u> 16,49

Примітка : • **Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.**

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 74952,7 грн.,
у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 68313,61 грн.;
- зарплата в експлуатації машин: 603,14 грн.;
- зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 6035,95 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



"26" 12 2017 року

"26" 12 2017 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-2012;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРр-97);
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість	4,37116	тис.люд.-г
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	4,167	тис.люд.-г
Загальна кошторисна заробітна плата	127,81676	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8	5225,80	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8	5225,80	грн.
Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8	5225,80	грн.

...програмний комплекс АВК-3 (3.2.2)

Всього договірна ціна:
 у тому числі:
 будівельні роботи -
 вартість устаткування -
 у тому числі:
 - ризики і інфляція від вартості устаткування
 інші витрати -

1376,79262	тис.грн.
1302,57646	тис.грн.
-	тис.грн.
-	тис.грн.
74,21616	тис.грн.

Примітка:
 1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Гелік Ю. П. Воронков



Перевірив:

Ситко. 200. 27. 01. 21. Степанюк

Замовник Відділ освіти Покровської міської ради
(назва організації)

Підрядник Моршньова Ю.П.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2, що здійснюється в 2017 році

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	1243,48241	1243,48241	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	116,88253	116,88253	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1124,67922	1124,67922	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,92066	1,92066	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	47,24821	47,24821	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (приспосовання) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1290,73062	1290,73062	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	11,84584	11,84584	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	5,37653	-	5,37653
			<i>458725,01</i>		
			<i>11845,84</i>		
			<i>5376,53</i>		

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	1307,95299	1302,57646	5,37653
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	68,83963	-	68,83963
		Разом договірна ціна	1376,79262	1302,57646	74,21616
		Всього договірна ціна	1376,79262		
		в т.ч. зворотні суми:			

Забезпечення збитком - 832,005,81

Керівник підприємства
(організації) замовника

Технічний



С.В. Гуренко



М. Шереметьєв

Григорук Н.Ф.
з сніжани
м.п.

організація -
од ЄДРПОУ - ()
освіти Покровської міської ради
ова Ю.П.
07 вересня 2017 р.
ництва та його адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-
ровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м.
енко, вул. Шкільна, 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 р.

(тис. грн.)

назва об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
A	1	2	3
виконаних будівельних робіт по	1056,90669	1056,90669	1056,90669
у тому числі:			
ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шкільна, 2	1056,90669	1056,90669	1056,90669
роботи	1000,91742	1000,91742	1000,91742
витрати	55,98927	55,98927	55,98927
виконаних будівельних робіт	1056,90669	1056,90669	1056,90669
як виключається з підсумку			669,50000
			387,40669


установлення, меблів, інвентарю, що придбаваються виконавцем робіт



"26" грудня 2017 року

"26" грудня 2017 року

28.12.2017
3132
[Signature]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Ремонт покрівлі				
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	12,8	а
2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	100м2	12,8	
3	Установлення кріплень крокв скобами	100шт	0,13	
4	Улаштування прокладної пароізоляції плівкою насухо	100м2	15	
5	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	3,05	
6	Улаштування покрівель двоххилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	12,8	
7	Улаштування примикань з покрівельних матеріалів	100 м	1,01	
8	Улаштування настилу з дощок для проходу по металочерепиці	м2 наст.	12	
Розділ. Утеплення покрівлі				
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,043	
10	Утеплення покриттів мінераловатними теплоізоляційними плитами в 2 шари	100м2	10	
11	Ремонт дерев'яних перекриттів із зміною накату з дощок	100 м2	0,043	
Розділ. ІНШІ РОБОТИ				
12	Навантаження сміття вручну	1 т	2	
13	Перевезення сміття до 18 км	т	2	
Розділ. Ремонт опалення				
14	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,83	
15	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,86252	

Склав



посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірив

посада, підпис, ініціали, прізвище



С.В. Зозенко

Деребівський інст. гос. гр Ім. М.П. Степанів

Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2
2017

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1290,73062 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,37116 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 127,81676 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1									
		Розділ 1. Ремонт покрівлі									
1	E46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	12,8	<u>701,04</u> 699,43	- -	√ 8973,31	8952,7	- -	<u>26,829</u> -	<u>343,41</u> -

Завищення предметних затрат - 882005,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	РН8-26-4	Улаштування лат (рештування) з <i>узел в</i> прозорами із дошок і брусків під покриття з <i>с.в. 12-1</i> черепиці	100м2	12,8	950,46 817,94	10,55 9,46	12100,89 10450,63		135,04 121,09	29,359 0,3142	375,8 4,02
3	С112-51 варіант 1	Дошки обрізні <i>цвяхи</i> в хвойних порід, товщина 25 мм	м м3	0,004 -12	18688,93 11050,00	-	1004,72 132000		-	-	-
4	С112-26 варіант 1	Бруски 50х50 <i>обрізки своїх</i> порід <i>Л-4,6,5 м; шир 75-150 мм</i>	м3	13,2 -5,36	3800 11050,00	-	50160 59228		-	-	-
5	РН8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами <i>10 едр</i>	100шт	0,13	2258,12 293,77	-	293,56 38,19		-	9,999	1,3
6	РН8-31-1	Улаштування <i>узел</i> плівкою <i>в с.в. 12-1</i> насухо	100м2	15	218,58 214,81	3,77 3,38	3238,7 3222,15		56,55 50,7	7,854 0,1122	117,81 1,68
7 & С111- 1720-1 варіант 1	Плівка універсальна пароізоляційна	м2	1725	15,60	-	-	26910		-	-	-
8 & С111- 1678-1-Н	Стрічка монтажна універсальна 2-стороння (скотч) <i>цвяхи 2,5х40 мм</i>	1000м	0,76	21724,06	-	-	977,58		-	-	-
9	ЕН10-55-1	Вогнезахист <i>узел в</i> дерев'яних конструкцій ферм арок, балок, крокв, мауерлатів <i>с.в. 12-1</i>	10м3	3,05	398,16 398,16	-	1213,39 6000	1213,39	-	13,552	41,33
10 & С1113- 286-1	Вогнезахисний матеріал БС-13(10)	кг	100	60 291,00	-	-	20100		-	-	-
11	Е12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	12,8	4043,10 3926,55	114,40 34,27	51751,68 50259,84		1464,32 438,66	137,148 0,825	1755,49 10,56
12	РН8-44-1	Улаштування примикань з покрівельних матеріалів	100 м	1,01	9562,63 3360,61	67,80 60,79	9658,26 3394,22		68,48 61,4	110,22 2,0196	111,32 2,04
13	С121-32 варіант 1	Снігозатримувач 2м	шт	100	1597,38	-	12000 459738		-	-	-
14	С111-1683-1 варіант 1	Конькова планка	м	200	105,11	-	10000 21022		-	-	-
15	С111-542 варіант 1	Вихід на дах <i>нет такого вида работ для ресурса</i>	м2	12,6	3610,00	-	45486		-	-	-
16	ПР12-3017	Улаштування настилу з дошок для проходу по металочерепиці	м2 наст.	12	556,41 41,56	4,00 1,42	6676,92 498,72		48 17,04	1,452 0,0439	17,42 0,53
Разом прямі витрати по розділу 1							561522,2	78049,84	1772,39 688,89		2763,88 18,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	<i>фактичне за</i>		<i>186771,47</i>		561522,2 481699,97 78738,73 31677,5 137,68 6896,31 593199,7				
					<i>31677,50</i>						
					<i>218148,94</i>						
		Всього по розділу 1			<i>218148,94</i>		593199,7				
		Розділ 2. Утеплення покрівлі									
17	PH8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,043	<u>438,22</u> 433,32	<u>4,90</u> 4,39	18,84 18,63	18,63	<u>0,21</u> 0,19	<u>14,212</u> 0,1459	<u>0,61</u> 0,01
18	C111-1716 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	4,73	<u>8,64</u>	-	40,87	-	-	-	-
19	E12-18-5 к=2	Утеплення покриттів мінераловатними теплоізоляційними плитами в 2 шари	100м2	10	<u>2880,21</u> 2880,21	-	<u>28802,1</u> 28802,1	28802,1	-	<u>104,28</u>	<u>1042,8</u>
20	& C114-39- У-4 варіант 1	Мінераловатні теплоізоляційні плити	м3	<u>208</u>	<u>1744,45</u>	-	<u>359356,7</u>	-	-	-	-
21	PH4-9-1	Ремонт дерев'яних перекриттів із зміною нахату з дощок	100 м2	0,043	<u>74523,75</u> 7912,80 <u>3800</u>	-	3204,52 340	340,25	-	<u>284,02</u>	<u>12,21</u>
22	C112-26 варіант 2	Бруски обрізні 50-200 мм	м3	0,1	<u>11050,00</u>	-	<u>4405</u>	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2			<i>фактичне за</i>		392528,03	29160,98	<u>0,21</u> 0,19		<u>1055,62</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392528,03 363366,84 29161,17 11860,99 52,22 2616,1				
					<i>11860,99</i>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.				47761,22	404389,02				

		Всього по розділу 2				47761,22	404389,02				
		Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ									
23	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2	46,74	-	✓ 93,48	93,48	-	1,793	3,59
					46,74	-			-	-	-
24	C311-18-M	Перевезення сміття до 18 км	т	2	74,03	74,03	✓ 148,06	-	148,06	-	-
					-	9,40			18,8	0,263	0,53
		Разом прями витрати по розділу 3					241,54	93,48	148,06		3,59
		Разом будівельні роботи, грн.					241,54		18,8		0,53
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					112,28				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45,9				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10,18				
		Всього будівельні роботи, грн.					287,44				

		Всього по розділу 3					✓ 287,44				
		Розділ 4. Ремонт опалення									
25	PH15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,83	3258,69	-	2704,71	2704,71	-	115,885	96,18
					3258,69	-			-	-	-
26	PH15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,86252	3693,30	-	6878,85	6873,52	-	122,606	228,36
					3690,44	-			-	-	-
					180,2	-	1942,80 =		-	-	-
27	& C130-559-3	Радіатори біметаличні	секція	996	280,73	-	279607,08	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					289190,64	9578,23	-		324,54
		Разом будівельні роботи, грн.					289190,64				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					279612,41				
		всього заробітна плата, грн.					9578,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.			3663,82		3663,82				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			14,05		14,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			703,76		703,76				
		Всього будівельні роботи, грн.			292854,46		292854,46				
		-----			192527,38						
		Всього по розділу 4			192527,38		292854,46				
		Разом прями витрати по кошторису		фактичне зОТ 411'476,80	1243482,41		1243482,41	116882,53	1920,66		4147,63
		Разом будівельні роботи, грн.			41		41		707,88		19,37
		в тому числі:			1124679,22		1124679,22				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.			117590,41		117590,41				
		всього заробітна плата, грн.			47248,21		47248,21				
		Загальновиробничі витрати, грн.		472'48,21	204,16		204,16				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			10226,35		10226,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1290730,62		1290730,62				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		-----			1290730,62		1290730,62				
		Всього по кошторису		458'725,01							
		Кошторисна трудоємність, люд.год.			4371,16		4371,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.		458'725,01	127816,76		127816,76				

Склав

А.П. Черненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

С.В. Уроденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Уроденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
С.В. Уроденко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підприємство, організація -

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()

Замовник - Відділ освіти Покровської міської ради

Підрядник - Моршньова Ю.П.

Договір №27 від "07" вересня 2017 р.

Найменування будівництва та його адреса - Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ*

за грудень 2017 р.

(тис. грн.)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних будівельних робіт по об'єкту будівництва	1056,90669	1056,90669	1056,90669
у тому числі:			
1. Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2	1056,90669	1056,90669	1056,90669
у тому числі:			
1. Будівельні роботи	1000,91742	1000,91742	1000,91742
2. Інші витрати	55,98927	55,98927	55,98927
Всього вартість виконаних будівельних робіт	1056,90669	1056,90669	1056,90669
Авансова плата, що виключається з підсумку			669,50000
Разом до сплати			387,40669

* Витрати вартість устаткування, меблів, інвентарю, що придбаються виконавцем робіт

М. П. Замовник

"26" грудня 2017 року

М. П. Підрядник

"26" грудня 2017 року

28.12.2017

3132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<p><u>Локальний кошторж</u> (1)</p> <p><u>2-1-1</u></p> <p><u>на Капітальний ремонт Шевченківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Покровської міської ради Донецької області за адресою: 85316, Донецька обл., м. Покровськ, смт. Шевченко, вул. Шкільна, 2</u></p> <p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1</p> <p><u>Розділ . Ремонт покрівлі</u></p>									
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	11,2	701,04	699,43	-	✓ 7851,65	300,48	
	<i>Р о з р а х у н о к о д н и н и ч н о ї в а р т о с т і</i>						E46-40-4			
	<i>Заробітна плата, грн.</i>		<i>грн.</i>	26,829	26,07			699,43		
	<i>Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2</i>									
	<i>Машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</i>									
	<i>Лобідики електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]</i>	CH203-405	<i>маш-год</i>	0,693						
	<i>М а т е р і а л и</i>									
	<i>Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат</i>									
	<i>Електроенергія</i>	C1999-9001	<i>кВт-год</i>	0,77616	1,5894			1,23		
	<i>Масляні матеріали</i>	C1999-9005	<i>кг</i>	0,00693	54,36			0,38		
	<i>Разом матеріалів, грн.</i>							1,61		
2	Улаштування лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з черепиці	PH8-26-4	100м2	11,2	950,46	817,94	10,55 9,46	10645,15	328,82 3,52	
	<i>Р о з р а х у н о к о д н и н и ч н о ї в а р т о с т і</i>						PH8-26-4			
	<i>Заробітна плата, грн.</i>		<i>грн.</i>	29,359	27,86			817,94		
	<i>Витрати труда робітників - будівельників Середній розряд робіт 2,7</i>									
	<i>М а ш и н и т а м е х а н і з м и</i>									
	<i>Кран переносний, вантажопідйомність 1 т</i>	CH202-970	<i>маш-год</i>	0,308			34,24 30,70	10,55		
	<i>Разом машин та механізмів</i>							10,55		
	<i>М а т е р і а л и</i>									
	<i>Цвяхи будівельні</i>	C111-1853-7 варіант 1	<i>т</i>	0,0042	29040,00			121,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Машини та механізм									
	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	CH202-1141	маш-год	0,55			208,00 62,31	114,40		
	Разом машин та механізмів							114,40		
	Машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат									
	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0, 59 т]	CH203-401	маш-год	1,419						
	Пилка дискова електрична	CH270-90	маш-год	1,705						
	Матеріали									
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат									
	Електроенергія	C1999-9001	кВт-год	0,86625	1,5894			1,38		
	Мастильні матеріали	C1999-9005	кг	0,01419	54,36			0,77		
	Разом матеріалів, грн.							2,15		
12	Улаштування примикань з покрівельних матеріалів	PH8-44-1	100 м	0,89	9562,63	3360,61	67,80 60,79	8510,74	98,1 1,8	
	Розрахунок одиничної вартості						PH8-44-1			
	Заробітна плата, грн.									
	Витрати труда робітників - будівельників		грн.	110,22	30,49			3360,61		
	Середній розряд робіт 3,5									
	Машини та механізм									
	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	CH202-970	маш-год	1,98			34,24 30,70	67,80		
	Разом машин та механізмів							67,80		
	Машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат									
	Перфоратори електричні	CH270-135	маш-год	17,094						
	Матеріали									
	Прокат штабовий	C111-1816 варіант 1	т	0,075	26187,01			1964,03		
	Цвяхи будівельні	C111-1853-7 варіант 1	т	0,0016	29040,00			46,46		
	Бруски обрізні	C112-26 варіант 3	м3	0,3	11050,00			3315,00		
	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	C1425-11684	м3	1,05	759,35			797,32		
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат									
	Електроенергія	C1999-9001	кВт-год	7,17948	1,5894			11,41		
	Разом матеріалів, грн.							6134,22		
13	Снігозатримувач 2м	C121-32 варіант 1	шт	88	1597,38			140569,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Діагностори біметалічні	С130-559-3	секція	996	280,73		-	279607,08	-
								279607,08	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							966264,79	2419,06 16,49
I.	Разом прями витрати		грн.					966264,79	2419,06 16,49
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					896399,92	
	- заробітна плата		грн.					68313,61	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1551,26	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					603,14	- 16,49
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					27725,73	120,50
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					993990,52	2539,56 16,49
	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
V.	Інші супутні витрати		грн.					993990,52	2539,56 16,49
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					993990,52	2539,56 16,49
VI.	Прибуток (2,71)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					6926,90	
VII.	Адміністративні витрати (1,23)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3143,94	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					1000917,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					1004061,36	2539,56 16,49
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції								
	1. Разом		грн.					1004061,36	
	- Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	Розрахунок N П-137	грн.					52845,33	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		грн.					1056906,69	2539,56 16,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дого за актом		грн.					1056906,69	2539,56
	у тому числі: зворотні суми								16,49

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 74952,7 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 68313,61 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 603,14 грн.;
 - зарплата у складі загальнопромислових витрат: 6035,95 грн.

М. П. Замовник

М. П. Підрядник



"26" 12 2017 року

"26" 12 2017 року
